



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
27/05/2024

Empreendimento
La Maison

Incorporadora / Grupo
Construtora Colmeia S/A

Localização
Rua Teresina esquina com a Rua Mário Ypiranga

Segmento
Residencial

MONITORAMENTO DE OBRA

Data Base Abril

Periodicidade Mensal

Índice

- 1 Dashboard - Obra
- 2 Evolução de Obra
- 3 Histórico do Empreendimento
- 4 Orçamento de Obra
- 5 Relatório de Visita Técnica
- 6 Relatório Fotográfico
- 7 Gastos Validados
- 8 Gastos Pendentes



CAPITAL FINANCE


Responsável: Mauricio K. Fukuda

Construtora Colmeia S/A

Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado



Realizado x Comprovado - Gastos da SPE

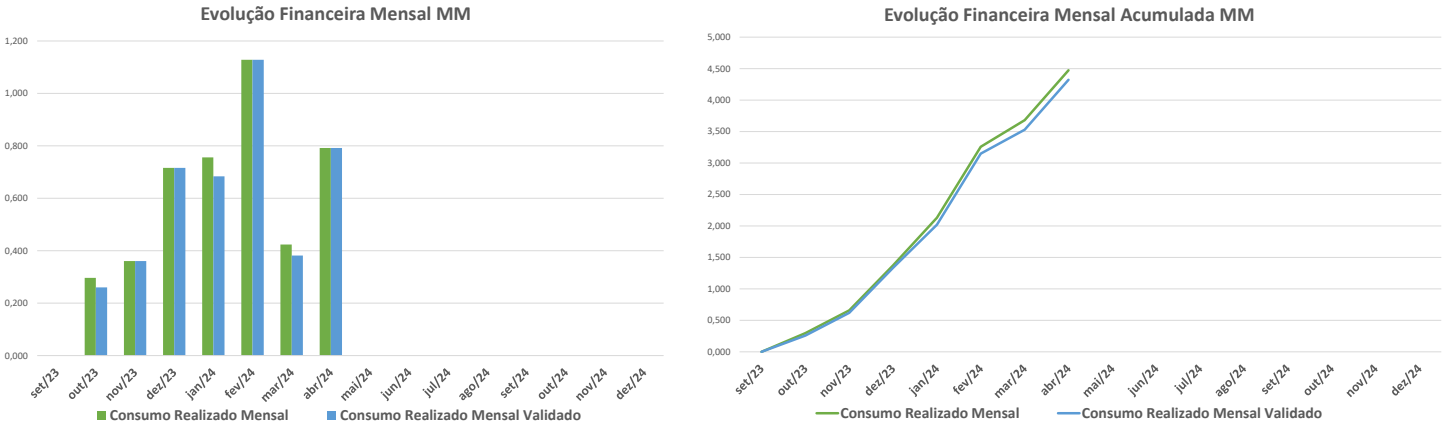

Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	A visita ocorreu em 11/05/2024 e validou-se a evolução físico-financeira de 3,46%, ficando acima do esperado em 0,21%.
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para Abril era de 63,2%, o realizado está em 64,03%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 0,792 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 0,792 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Foram feitos todos os envios necessários para realização deste relatório.
Outras Informações	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	Em visita realizada ao empreendimento visualizou-se a placa com o número do processo aprovado pela prefeitura local e o nome do Engenheiro responsável na obra.

Evolução de Obra

Evolução Físico-Financeira do Empreendimento enviada mensalmente pela Incorporadora e validada pela Capital Finance em visita a obra.

* Em %

Evolução Físico-Financeira	% Previsto	% Realizado	% Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	46,10%	46,10%	46,10%	46,10%
set/23	0,00%	0,00%	46,10%	46,10%
out/23	2,48%	2,48%	48,58%	48,58%
nov/23	1,67%	1,67%	50,25%	50,25%
dez/23	2,61%	2,61%	52,86%	52,86%
jan/24	2,27%	2,18%	55,13%	55,05%
fev/24	2,09%	2,24%	57,22%	57,28%
mar/24	3,35%	3,28%	60,57%	60,57%
abr/24	3,25%	3,46%	63,82%	64,03%
mai/24	4,03%		67,85%	
jun/24	3,61%		71,46%	
jul/24	4,05%		75,51%	
ago/24	4,57%		80,08%	
set/24	4,51%		84,59%	
out/24	5,19%		89,78%	
nov/24	5,17%		94,95%	
dez/24	5,05%		100,00%	
Total	100,00%	64,03%		

* Em Milhões de Reais

Evolução Físico-Financeira	R\$ Previsto	R\$ Realizado	R\$ Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	16,620	16,620	16,620	16,620
set/23	0,000	0,000	16,620	16,620
out/23	0,892	0,892	17,512	17,512
nov/23	0,602	0,602	18,114	18,114
dez/23	0,942	0,942	19,056	19,056
jan/24	0,817	0,787	19,874	19,843
fev/24	0,754	0,806	20,628	20,649
mar/24	1,207	1,184	21,834	21,833
abr/24	1,173	1,249	23,007	23,082
mai/24	1,453		24,460	
jun/24	1,301		25,761	
jul/24	1,459		27,221	
ago/24	1,648		28,868	
set/24	1,627		30,495	
out/24	1,870		32,365	
nov/24	1,863		34,228	
dez/24	1,821		36,049	
Total	36,049	23,082		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de Abril e validação destes em obra

SERVIÇO	VALOR INCORRIDO DO ITEM	CONFERÊNCIA EM OBRA PELA CAPITAL FINANCE
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.059,49	Consta
INSTALAÇÕES	R\$ 390.080,00	Consta
ELEVADORES	R\$ 61.022,18	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 86.102,80	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 417.396,65	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 71.984,89	Consta
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 61.356,79	Consta
MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 49.723,88	Consta
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 11.934,53	Consta
REDE DE ENERGIA	R\$ 95.946,99	Consta
TOTAL	R\$ 1.248.608,20	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	
Mês Base	Valor
	* Em Milhões de Reais
Até 1º Relatório	1,600
out/23	0,892
nov/23	0,602
dez/23	0,942
jan/24	0,787
fev/24	0,806
mar/24	1,184
abr/24	1,249
TOTAL	8,062

Custo Incorrido e Saldo a Incorrer do Fundo de Obras em milhões de reais

INCORRIDO	8,062
A INCORRER	11,367
Total	19,429

Gastos da SPE

Suporte de gastos da SPE, valor informado e valor validado, respectivamente.

Gastos da SPE		
* Em Milhões de Reais		
	INFORMADOS	VALIDADOS
out/23	0,297	0,260
nov/23	0,361	0,361
dez/23	0,716	0,716
jan/24	0,756	0,684
fev/24	1,128	1,128
mar/24	0,424	0,382
abr/24	0,792	0,792
mai/24		
jun/24		
jul/24		
ago/24		
set/24		
out/24		
nov/24		
dez/24		
TOTAL	4,473	4,322

Histórico do Empreendimento

set/23

out/23

nov/23

A Capital Finance questionou os itens 10.07 e 10.09 por serem de revestimento em argamassa e já incidirem no avanço físico-financeiro mesmo não havendo cerâmica em obra. Segundo a Incorporadora não se trata de etapas de revestimento cerâmico e sim de reboco em argamassa.

dez/23

Constam no avanço físico-financeiro e em obra os itens 5.09 Instalações de Gás e 5.15 Instalações Sanitárias – Pav. Tipo, entretanto, ambos não estão computados no valor total. A Incorporadora foi questionada, mas ainda não obtivemos resposta.

jan/24

Em janeiro a Incorporadora informou novo fluxo mês a mês para o físico-financeiro, sem alteração da data de finalização. A nova curva já consta neste relatório.

fev/24

Já incorrem as parcelas do elevador, previsão de instalação para junho/julho

mar/24

Primeiro elevador previsto para ser instalado até 30/07

abr/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acima do previsto mensal, principalmente em acabamentos internos.

ORÇAMENTO ORIGINAL DA OBRA

Código da Etapa	Nome da Etapa	Valor Previsto em Reais (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 411.097,75	1,14%
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 288.174,17	0,80%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.924.239,27	8,11%
4	ESTRUTURA	R\$ 7.910.418,96	21,94%
5	INSTALAÇÕES	R\$ 2.900.074,06	8,04%
6	ELEVADORES	R\$ 1.231.643,64	3,42%
7	ELEVAÇÃO	R\$ 2.129.985,87	5,91%
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.778.368,25	4,93%
9	ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 3.678.615,60	10,20%
10	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 1.849.898,09	5,13%
11	PINTURA	R\$ 853.581,58	2,37%
12	APARELHOS	R\$ 501.801,66	1,39%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 1.900.889,10	5,27%
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 747.279,26	2,07%
15	LIMPEZA	R\$ 127.519,25	0,35%
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.476.551,03	12,42%
17	MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 1.390.926,24	3,86%
18	HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 363.570,96	1,01%
19	REDE DE ESGOTO	R\$ 200.524,55	0,56%
20	REDE DE ENERGIA	R\$ 383.787,94	1,06%
		R\$ 36.048.947,24	100,00%

CONTRATOS DE PERMUTA

CPNTRATADO	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	VALOR
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO, CONFECCÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS	R\$ 950.005,00
AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA EIRELI	35.198.773/0001-09	BLOCOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 154.143,60
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	11.174.512/0001-90	AÇO CORTADO E DOBRADO PARA A ARMAÇÃO DE VIGAS E LAJES	R\$ 103.870,27
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO	R\$ 367.242,49
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SHAFT EM DRYWALL	R\$ 53.100,00
LM ENGENHARIA LTDA	04.449.357/0001-02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO	R\$ 240.000,00
MM GESSO E SERVICOS DE PINTURA LTDA	11.029.019/0001-87	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE COM BLOCO DE GESSO	R\$ 565.191,00
			R\$ 2.433.552,36

Relatório da Visita Técnica

Nº de Trabalhadores	43	Data da Vistoria	11/05/2024	Hora da Visita:	11:30	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	----	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

Pontos Relevantes:

1. Visita Técnica

Houve aumento no efetivo quanto a mão de obra resultando em uma aceleração da obra com serviços de aplicação de pastilhas cerâmicas na fachada, reboco de interno, alvenaria e encunhamento, infraestrutura de elétrica, hidrossanitária, água fria e gás, que seguem o seguinte posicionamento de avanço:

Estrutura: finalizada;
 Chapisco: 23º Andar
 Alvenaria: 23º Andar
 Infraestrutura de elétrica: 23º Andar
 Montagem de quadros elétricos: 15º Andar
 Infraestrutura de gás: 19º Andar
 Contrapiso: 17º Andar
 Reboco: 23º andar
 Instalações hidrossanitárias: 18º Andar
 Instalações de água fria: 15º Andar
 Porcelanato: 14º Andar
 Revestimento cerâmico (paredes): 4º Andar
 Revestimento cerâmico de fachada
 Fachada 01: 0
 Fachada 02: 80%
 Fachada 03: 0
 Fachada 04: 25%

Containers com revestimento cerâmico chegando semanalmente. (cerâmicas da FACHADA, porcelanatos e cozinha).

2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 40 colaboradores atestados em visita;

4. Estoque

5. Visita realizada por:

Helder Freire da Silva - CREA/AM 0411611801;

6. Houve reformulação de Cronograma?

Não;

7. Foi constatado alteração em relação ao Projeto apresentado?

Inicialmente a alvenaria de elevação dos apartamentos seriam com blocos de gesso, no período pós-pandemia os preços do insumos em questão sofreu forte aumento de preço inviabilizando o projeto, a direção fez reanálise e optaram por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

8. Foi constatada situação que compromete a evolução e/ou qualidade da obra?

A obra tem apresentado uma evolução lenta mas foi alegado que os recursos disponibilizados para a obra foi utilizado para pagar parcelas de fornecedores e aquisição de materiais que serão utilizados futuramente, nesta visita foi apresentado plano de contratação para aumentar equipe de mão de obra dando mais produtividade para os próximos meses. Verificou-se também a chegada da 1ª remessa de pastilhas cerâmicas da fachada.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11/05/2024




Fachada

Trecho em execução.

Instalação hidrossanitário

Execução de infra hidrossanitária, 18º andar

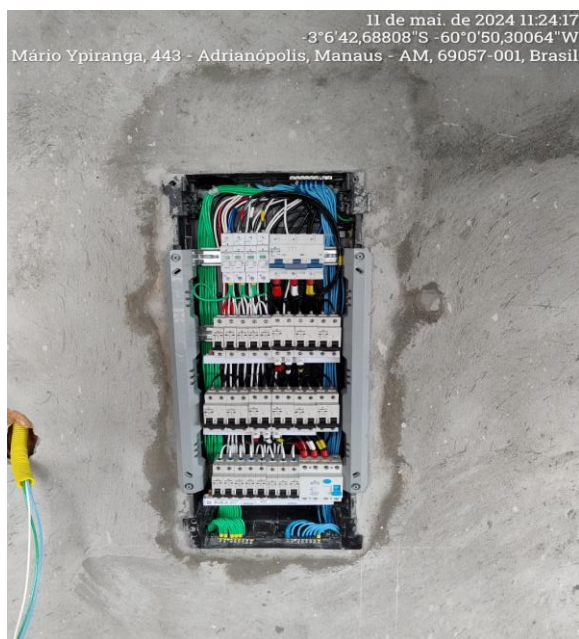

Infra de elétrica

Montagem de quadro elétrico e cabeamento, 15º andar

Instalação de gás

Execução de infra de gás, 19º andar



Contrapiso

Execução de contrapiso, 17º andar

Piso Cerâmico

Aplicação de porcelanato, 14º andar.



Gastos Validados em Abril/24

103

Total Líquido Pago:

R\$ 791.950,77

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/04/2024	00029301	R\$ 100.000,00
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	08/04/2024	00029501	R\$ 71.054,17
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	29/04/2024	19988	R\$ 70.314,67
INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA	10/04/2024	00030201	R\$ 65.000,00
CUSTOM BRASIL TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	10/04/2024	00030001	R\$ 62.685,48
S V INSTALACOES LTDA	30/04/2024	00031901	R\$ 50.000,00
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	18/04/2024	19676	R\$ 46.472,46
SV INSTALACOES LTDA	08/04/2024	00029701	R\$ 45.700,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	11/04/2024	19837	R\$ 30.207,09
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	08/04/2024	000000901	R\$ 23.465,00
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	30/04/2024	000009401	R\$ 18.700,50
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10/04/2024	00030101	R\$ 17.121,60
POLIMIX CONCRETO LTDA	15/04/2024	00030501	R\$ 16.200,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	24/04/2024	0000271-01	R\$ 12.508,30
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	09/04/2024	0000268-01	R\$ 10.785,51
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2024	19677	R\$ 10.020,41
FORTRESS CONSTRUCOES LTDA	25/04/2024	00031701	R\$ 9.201,00
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	29/04/2024	19987	R\$ 8.471,21
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	15/04/2024	0005571-01	R\$ 8.450,20
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	22/04/2024	000936501	R\$ 8.199,00
IJP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30/04/2024	00033101	R\$ 7.310,28
ALELO S.A	11/04/2024	175	R\$ 6.709,58
IMPLURB - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	04/04/2024	012145501	R\$ 6.671,64
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	08/04/2024	00029601	R\$ 5.000,00
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	11/04/2024	19836	R\$ 4.859,21
S V INSTALACOES LTDA	25/04/2024	00031601	R\$ 4.525,00
I.P.T.U.	15/04/2024	000107623	R\$ 3.895,35
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/04/2024	000928701	R\$ 3.637,93
I.S.S. - IMPOSTO S/SERVICO	09/04/2024	032024001	R\$ 3.594,60
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	22/04/2024	00031101	R\$ 3.150,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	22/04/2024	00031401	R\$ 2.941,15
ROSILENA PEREIRA BATISTA	10/04/2024	000056402	R\$ 2.500,00
ESUDA TRANSPORTES E SERVICOS DE COLETA LTDA	15/04/2024	000390701	R\$ 2.292,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	22/04/2024	00031501	R\$ 2.004,57
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRA	29/04/2024	19989	R\$ 2.000,00
LJ GUERRA & CIA LTDA	04/04/2024	00028401	R\$ 1.900,58
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	04/04/2024	00028701	R\$ 1.800,90
I.R.R.F.(PESSOAL-PF)	18/04/2024	579	R\$ 1.790,70
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	22/04/2024	00030801	R\$ 1.548,74
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	15/04/2024	00043824-01	R\$ 1.513,20
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	04/04/2024	00022136-01	R\$ 1.450,00
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	04/04/2024	00000220-01	R\$ 1.448,10
ROSILENA PEREIRA BATISTA	22/04/2024	000057201	R\$ 1.447,50
LINEAR ACESSORIOS PARA CONSTRUCAO LTDA	10/04/2024	00030301	R\$ 1.354,85
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	04/04/2024	00003602-01	R\$ 1.350,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	15/04/2024	00003655-01	R\$ 1.300,00
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15/04/2024	00011511-01	R\$ 1.280,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	25/04/2024	00031301	R\$ 1.203,70
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	15/04/2024	00043833-01	R\$ 1.152,00
CLUBE PASI DE SEGUROS	29/04/2024	176	R\$ 1.089,76
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	04/04/2024	00028901	R\$ 1.000,00

MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	22/04/2024	00030601	R\$	998,48
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	25/04/2024	000935101	R\$	951,67
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 43640869249	15/04/2024	000004301	R\$	900,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	15/04/2024	00003573-01	R\$	900,00
LHS CERTIFICACAO E AVALIACAO LTDA - ME	15/04/2024	000156501	R\$	875,00
MAXQUALITY CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	22/04/2024	000065201	R\$	842,34
I.P.T.U.	15/04/2024	000880302	R\$	835,66
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	25/04/2024	00031201	R\$	834,00
FABIO RENATO RODRIGUES CATIQUE 71765980291	01/04/2024	000002901	R\$	780,00
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	04/04/2024	19542	R\$	722,73
IMPOLUT LTDA ME	04/04/2024	00028801	R\$	615,00
N. C. DE O. CORREA EPP	04/04/2024	00007501-01	R\$	600,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	10/04/2024	00043770-01	R\$	576,00
STA TRANSPORTES LTDA	22/04/2024	00030901	R\$	556,06
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	22/04/2024	00043869-01	R\$	540,00
PENSAO ALIMENTICIA	30/04/2024	19992	R\$	538,49
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	04/04/2024	00029001	R\$	506,35
ENNE HELEN ALBUQUERQUE DOS SANTOS	18/04/2024	000067501	R\$	502,74
ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	04/04/2024	00028601	R\$	482,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	23/04/2024	00043849-01	R\$	480,80
AMBIENK SANEAMENTO LTDA	04/04/2024	000726701	R\$	475,00
AMBIENK SANEAMENTO LTDA	15/04/2024	000739301	R\$	475,00
N. C. DE O. CORREA EPP	04/04/2024	00007484-01	R\$	454,00
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10/04/2024	00022122-01	R\$	442,50
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	30/04/2024	00115212-02	R\$	439,96
PESSOAL (DEMISSOES)	02/04/2024	19640	R\$	438,07
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	04/04/2024	00028001	R\$	427,40
LJ GUERRA & CIA LTDA	04/04/2024	00029401	R\$	407,04
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMEPZA LTDA - ME	22/04/2024	00011027-01	R\$	400,00
SERVICO SOCIAL DA IND. DA CONST. C. DE MANAUS - SECONCI	10/04/2024	000049901	R\$	380,00
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	09/04/2024	001278301	R\$	356,25
ROSILENA PEREIRA BATISTA	22/04/2024	000057301	R\$	337,75
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	08/04/2024	001000101	R\$	304,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	30/04/2024	001011601	R\$	304,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	30/04/2024	00043916-01	R\$	300,00
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	04/04/2024	000067501	R\$	293,55
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	15/04/2024	000068301	R\$	293,16
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	08/04/2024	000283001	R\$	285,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	10/04/2024	00029801	R\$	281,60
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	15/04/2024	00030401	R\$	280,80
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	10/04/2024	00029901	R\$	274,31
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	25/04/2024	00031001	R\$	260,00
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	10/04/2024	000683501	R\$	256,97
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	22/04/2024	00043872-01	R\$	237,50
LJ GUERRA & CIA LTDA	04/04/2024	00029101	R\$	230,87
A R VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE LIMEPZA LTDA - ME	08/04/2024	00010989-01	R\$	200,00
GELFABIO DA SILVA MAIA 74084585300	18/04/2024	00030701	R\$	200,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	04/04/2024	00028501	R\$	180,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	08/04/2024	00043626-01	R\$	180,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	09/04/2024	000915801	R\$	129,36
TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/04/2024	00070503-01	R\$	67,16
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	09/04/2024	000149301	R\$	26,48
103	TOTAL			R\$ 791.950,77

Gastos Pendentes em Abril/24

0	Total Líquido Pago:	R\$	-
---	---------------------	-----	---

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
Não há gastos pendentes de comprovação			
0			R\$ -
